

2. ENTREGABLE 2: INCIDENTES Y MATRIZ DE RIESGOS.

Teniendo en cuenta que los incidentes ya se encuentran materializados, se registra su impacto y respuesta. La matriz que a continuación se muestra evalúa eventos futuros que podrían entorpecer la recuperación y establece responsables propuestos y fechas de decisión.

2.1. Incidentes materializados.

Incidente	Estado e impacto	Respuesta inmediata
I01 · Retraso del sandbox	Retraso de tres semanas indicado en el caso. Bloquea E2E y compromete el plazo.	Preparar casos y datos; acordar entrega y agenda externa. Evaluar mocks para verificaciones internas, según utilidad y esfuerzo. Revisar compromisos contractuales.
I02 · Vulnerabilidad alta	Hallazgo de seguridad que exige modificar la autorización backend: 80 horas acumuladas no previstas.	No lanzar la funcionalidad afectada sin validar la corrección. Corregir, revisar, realizar retest y regresión. Estimar capacidad y diferimientos con arquitectura y PO.

2.2. Riesgos futuros y decisiones.¹

Escala propuesta:

- Probabilidad (P): baja 1, media 2, alta 3.
- Impacto (I): menor 1, afecta entregables o requiere ajustes relevantes 2, compromete lanzamiento, seguridad, operaciones o cumplimiento o genera consecuencias económicas significativas 3.

P x I = 1-2 Bajo, 3-4 medio, 6-9 alto.

¹ **Nota:** La matriz evalúa riesgos derivados, no repite los hechos ya ocurridos.

Riesgo futuro	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable propuesto	Respuesta y fecha de decisión
R01 · Nueva demora o sandbox incompleto	3	3	9 (Alto)	PM y aliado externo	Mitigar: confirmar disponibilidad, alcance y escalación. D20: compromiso y agenda; D30: comprobar ambiente funcional.
R02 · Mocks incompatibles con la nueva versión	2	3	6 (Alto)	Arquitectura	Mitigar: especificación versionada y ejemplos confirmados. D17: confirmar especificación vigente y ejemplos con el aliado antes de construir los mocks. Adelantar verificaciones internas con esa información. D30–D33: comprobar la integración mediante E2E, una vez disponible el sandbox. Si faltan especificaciones o el ambiente se retrasa, escalar el impacto.
R03 · Corrección insuficiente o regresión	2	3	6 (Alto)	Ciberseguridad, QA y Desarrollo	Mitigar: revisión, retest independiente y regresión; impedir el lanzamiento afectado si no se aprueban. D25: código listo; D30: validaciones aprobadas.
R04 · Capacidad backend o QA insuficiente	3	3	9 (Alto)	PM y líderes técnicos, con PO	Mitigar: validar carga por rol, esfuerzo diferible y apoyo aprobado si procede. D15: decisión inicial de capacidad y alcance; escalar déficit e impacto.
R05 · Pruebas y aprobación externa exceden la ventana	2	3	6 (Alto)	PM y aliados externos	Mitigar: casos, evidencias, agenda y aprobadores acordados. D20: validar E2E D30–D33 y aprobación externa D33–D35, si aplica; escalar inviabilidad.
R06 · Duplicados o pendientes mal gestionados	2	3	6 (Alto)	Arquitectura y Operaciones, con QA	Mitigar: evitar reenvíos ciegos; validar duplicados, consulta de estados y conciliación. D20–D30: preparar procedimientos; D33: evidencia E2E; D35: cierre operativo.
R07 · Requisito legal o contractual sin atender	2	3	6 (Alto)	Cumplimiento y apoyo jurídico	Mitigar: confirmar requisitos por actor, responsables y evidencias. D20: mapa y brechas; D35: cierre de requisitos de lanzamiento. Bloquear salida si falta una condición obligatoria.

2.2.1. Tratamiento de riesgos y límites de la decisión.

- **Transferir:** Evaluar garantías, soporte y responsabilidades contractuales en caso de que existan; esto con la finalidad de distribuir las consecuencias económicas que se puedan derivar de los riesgos que no se logren mitigar. Cabe señalar que esto no elimina la necesidad de validar la integración.
- **Aceptar:** Documentar los riesgos residuales que se decida asumir, con justificación, aprobación de la autoridad correspondiente y seguimiento. El diferimiento de funcionalidades opcionales requiere aprobación de la PO como cambio de alcance. No se aceptará omitir requisitos obligatorios para cumplir la fecha objetivo.

2.3. INFORME EJECUTIVO A PO Y COMITÉ.

I. SITUACIÓN E IMPACTO DEL NEGOCIO

Se han presentado a la fecha 2 incidentes que comprometen el lanzamiento: (i) retraso de tres semanas del sandbox, que bloquea las pruebas E2E, y (ii) vulnerabilidad alta, cuya corrección requiere 80 horas backend acumuladas no previstas.

El escenario impactado proyecta el cierre en D55, es decir en semana 11, frente al objetivo de D40, semana 8. Puede extenderse si la corrección y sus validaciones no terminan en D30. La situación actual pone en riesgo los compromisos comerciales y las condiciones sectoriales indicadas en el caso.

II. RECOMENDACIÓN

Se recomienda priorizar la corrección y ajustar el MVP, difiriendo funcionalidades opcionales cuyo esfuerzo backend se estime y valide. Adicionalmente, adelantar la preparación operativa y las pruebas internas; desarrollar mocks mínimos únicamente si su utilidad y esfuerzo lo justifican.

La recuperación propone conservar D40 mediante E2E en D30–D33 y aprobación externa en D33–D35, cuando corresponda. Cabe resaltar que su viabilidad depende de confirmar capacidad del equipo, sandbox en D30 y acuerdo del aliado sobre esas ventanas.

III. DECISIONES SOLICITADAS

Decisión	Responsable de aprobación	Fecha propuesta
Priorizar la corrección y aprobar las funcionalidades que se aplazarán, una vez estimadas las horas backend que liberan.	PO, con validación técnica de arquitectura.	D15
Autorizar apoyo o presupuesto adicional, si el balance identifica un déficit.	Autoridad presupuestal correspondiente.	A más tardar D20
Confirmar compromisos externos o resolver la escalación si no permiten conservar D40.	Aliados correspondientes; comité para la decisión interna.	D20

IV. PRÓXIMA REVISIÓN Y DECISIÓN

El D20 se revisará si el equipo dispone del tiempo necesario y si el aliado confirma el sandbox y las fechas de pruebas. Con esa información se determinará si es viable mantener el lanzamiento en la semana 8. Si estas condiciones no se cumplen, se presentarán al comité las alternativas, su impacto en plazo y presupuesto y las medidas para gestionar los compromisos comerciales. El lanzamiento solo se autorizará cuando se completen las pruebas, los controles y las aprobaciones requeridas.

2.4. Matriz RACI.

Para la comprensión y lectura de la siguiente Matriz, se informa el significado de las siguientes abreviaturas.


- ARQ: arquitecto;
- DEV: desarrollo;
- CUM-J: Cumplimiento con apoyo jurídico;
- CIB Ciberseguridad;
- OPS Operaciones;
- EXT: procesadora y banco según su función.
- Comité: Autoridad interna competente para aprobar recursos y decidir el lanzamiento. Su decisión no sustituye las aprobaciones técnicas, jurídicas, de seguridad o externas exigibles.

Riesgo Operativo participa en la identificación y evaluación de riesgos, la revisión de los planes de contingencia y la validación de la preparación operativa antes del lanzamiento.

Actividad o decisión	PO	PM	ARQ	DEV	QA	CUM-J	CIB	OPS	EXT	Comité
Aprobar el alcance del MVP y el aplazamiento de funcionalidades opcionales	A	R	C	C	C	C	C	C	I	I
Estimar el esfuerzo y distribuir el trabajo técnico según la capacidad disponible	C	C	A/R	R	C	I	C	I	I	I
Aprobar recursos adicionales y su costo, si son necesarios	C	R	C	I	C	I	C	I	I	A
Corregir la vulnerabilidad en la autorización backend	I	C	A	R	C	I	C	I	C	I
Definir y construir mocks con especificaciones confirmadas del aliado	I	C	A	R	C	I	C	I	C	I
Verificar la corrección de seguridad mediante revisión y retest	I	I	C	C	R	I	A/R	I	I	I
Ejecutar la regresión funcional y documentar sus resultados	I	I	C	R	A/R	I	C	C	I	I
Validar requisitos jurídicos, regulatorios y contractuales aplicables	C	R	C	I	C	A/R	C	C	C	I
Entregar el sandbox y confirmar sus condiciones de uso	I	C	C	I	C	I	C	I	A/R	I
Obtener la aprobación externa de la integración, cuando corresponda	I	R	R	C	R	C	C	C	A	I
Preparar y validar procedimientos operativos, conciliación y atención de excepciones	C	C	C	C	C	C	C	A/R	C	I
Decidir si se autoriza el lanzamiento —Go / No-Go—	C	R	C	I	C	C	C	C	C	A
Ejecutar el despliegue técnico autorizado	I	C	A	R	R	I	C	R	C	I
Monitorear la operación y coordinar la atención de incidentes después del lanzamiento	I	C	C	R	R	C	C	A/R	C	I

2.5. Flujo de Comunicación.²

El siguiente flujo muestra cómo se comunican y gestionan los bloqueos del proyecto: desde su detección hasta la evaluación del impacto, la decisión correspondiente y la verificación del cierre.

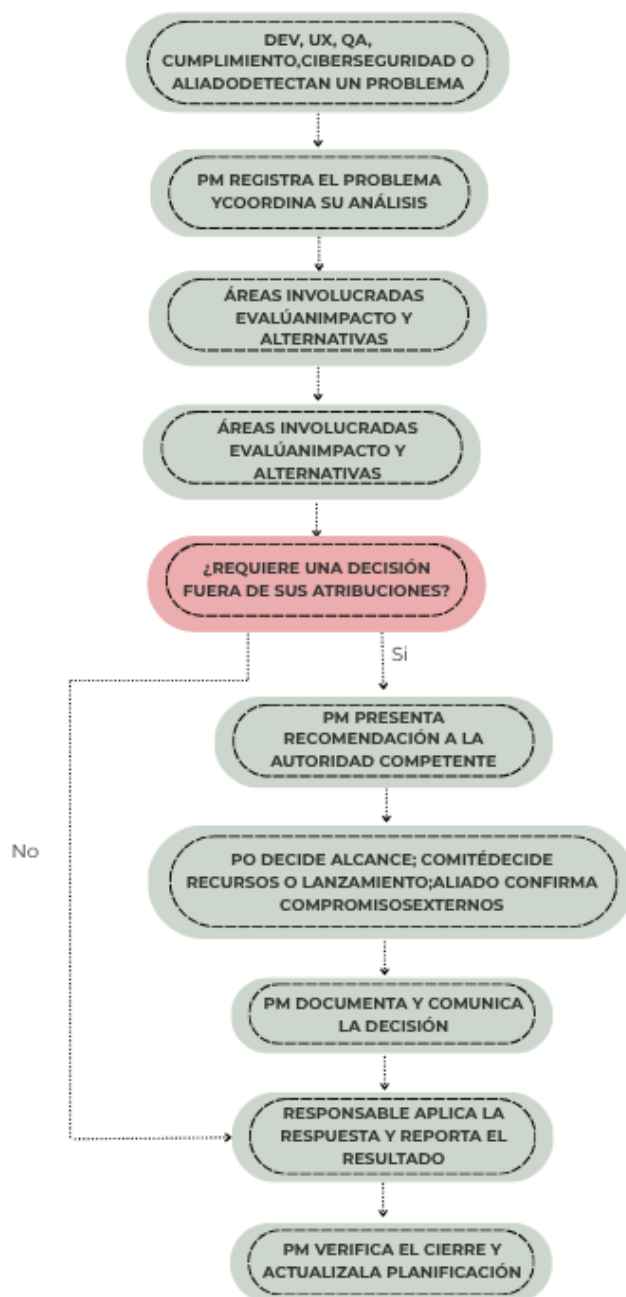

² **Nota:** Los bloqueos que comprometan la seguridad, el cumplimiento o la fecha de lanzamiento se escalan de inmediato. Las decisiones internas no sustituyen las aprobaciones exigibles del aliado.

2.5.1. Frecuencia de seguimiento.

Participantes	Frecuencia propuesta	Qué se comunica o revisa
PM, Desarrollo, Arquitectura y QA	Diariamente durante la recuperación	Avance, capacidad disponible, bloqueos y actividades que afectan la fecha de lanzamiento.
PM, PO y UX	Dos veces por semana y ante cambios de alcance	Funcionalidades que se mantienen o aplazan y efectos sobre la experiencia del usuario.
PM, Ciberseguridad, Cumplimiento y Riesgo Operativo	Dos veces por semana y en los hitos D15, D20, D25, D30 y D35, según su competencia	Requisitos aplicables, corrección de la vulnerabilidad, resultados de validación, riesgos pendientes y condiciones de lanzamiento.
PM, Arquitectura, QA y aliado externo	Seguimiento diario hasta D20; después, según la agenda acordada y ante desviaciones	Disponibilidad del sandbox en D30, especificaciones vigentes, preparación de E2E y requisitos de aprobación externa.
PM, Operaciones y QA	Durante la preparación operativa y antes de D35	Procedimientos, conciliación, atención de excepciones y preparación del soporte.
PM, PO, comité y Comercial	Semanalmente y de inmediato ante un desvío que comprometa el lanzamiento	Viabilidad de la semana 8, impacto en plazo y presupuesto, decisiones requeridas y comunicación comercial.
